


越谷市河川図

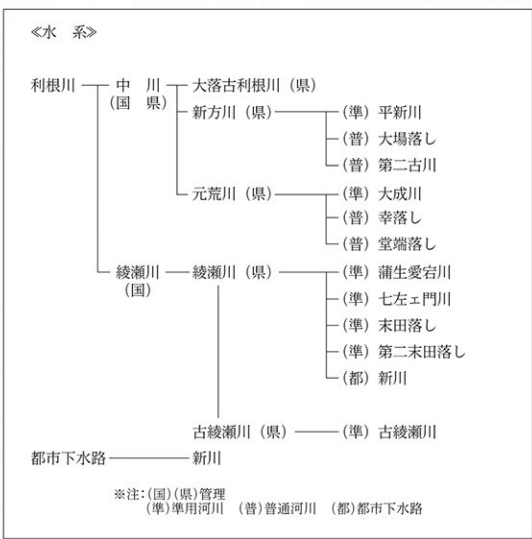

流域面積表

流域延長(km)	河川名	流域面積(km ²)
4.36(47.74)	本 川	5,439(2.37)
12.40(60.65)	本 川	8.44(208.86)
0.73	準用河川大成川	0.46
0.42	普通河川幸落し	0.16
5.81(31.57)	本 川	22.31(136.21)
1.30	準用河川蓮生愛宕川	3.20
2.70	準用河川七左エ門川	1.84
1.82(5.05)	準用河川末田落し	
1.88(2.08)	準用河川第二末田落し	(7.62)
10.68(11.00)	本 川	20.31(40.62)
2.40	準用河川平新川	1.00
0.60	普通河川大場落し	0.17
1.63	普通河川第二古川	0.69
10.50(26.70)	本 川	3.62(182.28)
0.41(4.50)	本 川	(5.37)
0.90(6.40)	本 川	(8.87)

排水機場等一覧表

番号	流域名	排水機場名	規模(m ² /s)	備考
1	元規川	外野合ポンプ場	0.70(0.35×2)	平成9年度完成
2	大場落し	北越谷五丁目	0.30(0.15×2)	昭和60年度完成
3	北越谷五丁目		0.40(0.20×2)	昭和59年度完成
4	左数田	左数田ポンプ場	0.92(0.46×2)	平成5年度完成(平成19年度増設)
5	大成川		0.08(0.04×2)	昭和62年度完成
6	北越谷一丁目		1.10(0.30×2+0.50)	昭和62年度完成(平成17年度増設)
7	空堀落し		0.90(0.45×2)	平成6年度完成
8	東越谷	東越谷ポンプ場	2.38(0.69×2+1.00)	平成17年度完成(令和4年度増設)
9	不		0.20(0.10×2)	平成3年度完成
10	下河原		0.35(0.175×2)	昭和63年度完成
11	飯島		0.50(0.25×2)	昭和62年度完成
12	大成川		2.00(1.00×2)	平成6年度完成
13	新方川	千間合第一ポンプ場	2.40(0.60×3)	平成9年度完成
14	コスモス		0.90(0.30×3)	平成3年度完成
15	上関久里	上関久里ポンプ場	2.18(0.725×3)	平成10年度完成
16	塚田	塚田ポンプ場	1.80(0.60×3)	平成12年度完成
17	大場落し		2.50(0.75×2+1.00)	昭和61年度完成
18	十間		0.40(0.20×2)	平成元年完成
19	柳		2.90(1.45×2)	平成3年度完成
20	豊野	豊野ポンプ場	0.60(0.25×2+0.50)	昭和62年度完成
21	沼田	沼田落し	0.65(0.50+0.15)	昭和56年度完成
22	平新川		3.00(1.00×3)	平成5年度完成
23	平方		0.70(0.35×2)	平成6年度完成
24	会之川		0.15(0.075×2)	昭和58年度完成
25	花野	花野第一ポンプ場	2.10(1.05×2)	平成21年度完成
26	綾瀬川	大開野	1.00(0.50×2)	昭和62年度完成
27	新川	新川ポンプ場	3.00(1.10×2+0.80)	平成2年度完成(令和4年度増設)
28	出羽	出羽ポンプ場	8.20(2.5×2+3.2)	平成3年度完成
29	七左エ門		2.00(1.00×2)	平成4年度完成
30	越谷第一	越谷第一ポンプ場	3.34(0.34×10+0.8×2)	昭和55年度完成
31	河川	河川第一ポンプ場	0.40(0.20×2)	平成元年完成
32	横井	横井	0.40(0.20×2)	平成13年度完成
33	中川	東町ポンプ場	3.13(1.565×2)	平成22年度完成
34	大相模	大相模調整池	3.70(0.72×2+1.13×2)	平成26年度完成

雨水流出抑制対策施設一覧(調整池)

番号	流域名	施設名	容量(m ³)	管理区
01	中川	中川調整池	20,300	41,200
02	新方川	新方川調整池	1,741	997
03	藤ヶ丘(その1)		283	169
04	藤ヶ丘(その2)		242	181
05	藤ヶ丘(その3)		340	237
06	藤ヶ丘(その4)		313	187
07	藤ヶ丘(その5)		156	109
08	佐吉新		2,332	2,214
09	赤十字部(その1)		509	203
10	赤十字部(その2)		353	158
11	赤十字部(その3)		346	241
12	東都赤十字部(その1)		245	318
13	東都赤十字部(その2)		992	1090
14	東都赤十字部(その3)		346	259
15	しらこぼと		749	1,116
16	越谷スカイハイ		867	785
17	越谷マイレハイ		813	967
18	大原		1,786	2,600
19	久伊豆		156	125
20	三東		1,310	851
21	三東		3,000	6,000
22	平方		1,781	1,400
23	綾瀬川	綾瀬川調整池	575	1,040
24	谷中	谷中調整池(1)	290	210
25	谷中	谷中調整池(2)	376	272
26	マセ	マセ調整池	763	330
27	七左第一	七左第一調整池	3,000	8,000
28	七左第二	七左第二調整池	5,800	16,000
29	七左第三	七左第三調整池	5,000	16,000
30	七左第四	七左第四調整池	1,200	700
31	七左第五	七左第五調整池	337	200
32	古綾瀬川	古綾瀬川調整池	0	356
33	中川	中川調整池	921	1,850
34	元規川	元規川調整池	20,000	60,000
35	東越谷	東越谷調整池	1,500	1,940
36	越谷中央	越谷中央調整池	2,386	6,060
37	新方川	新方川調整池(事業中)	5,360	14,000
38	綾瀬川	綾瀬川調整池	0	700
39	出羽	出羽調整池	86,368	189,062

